





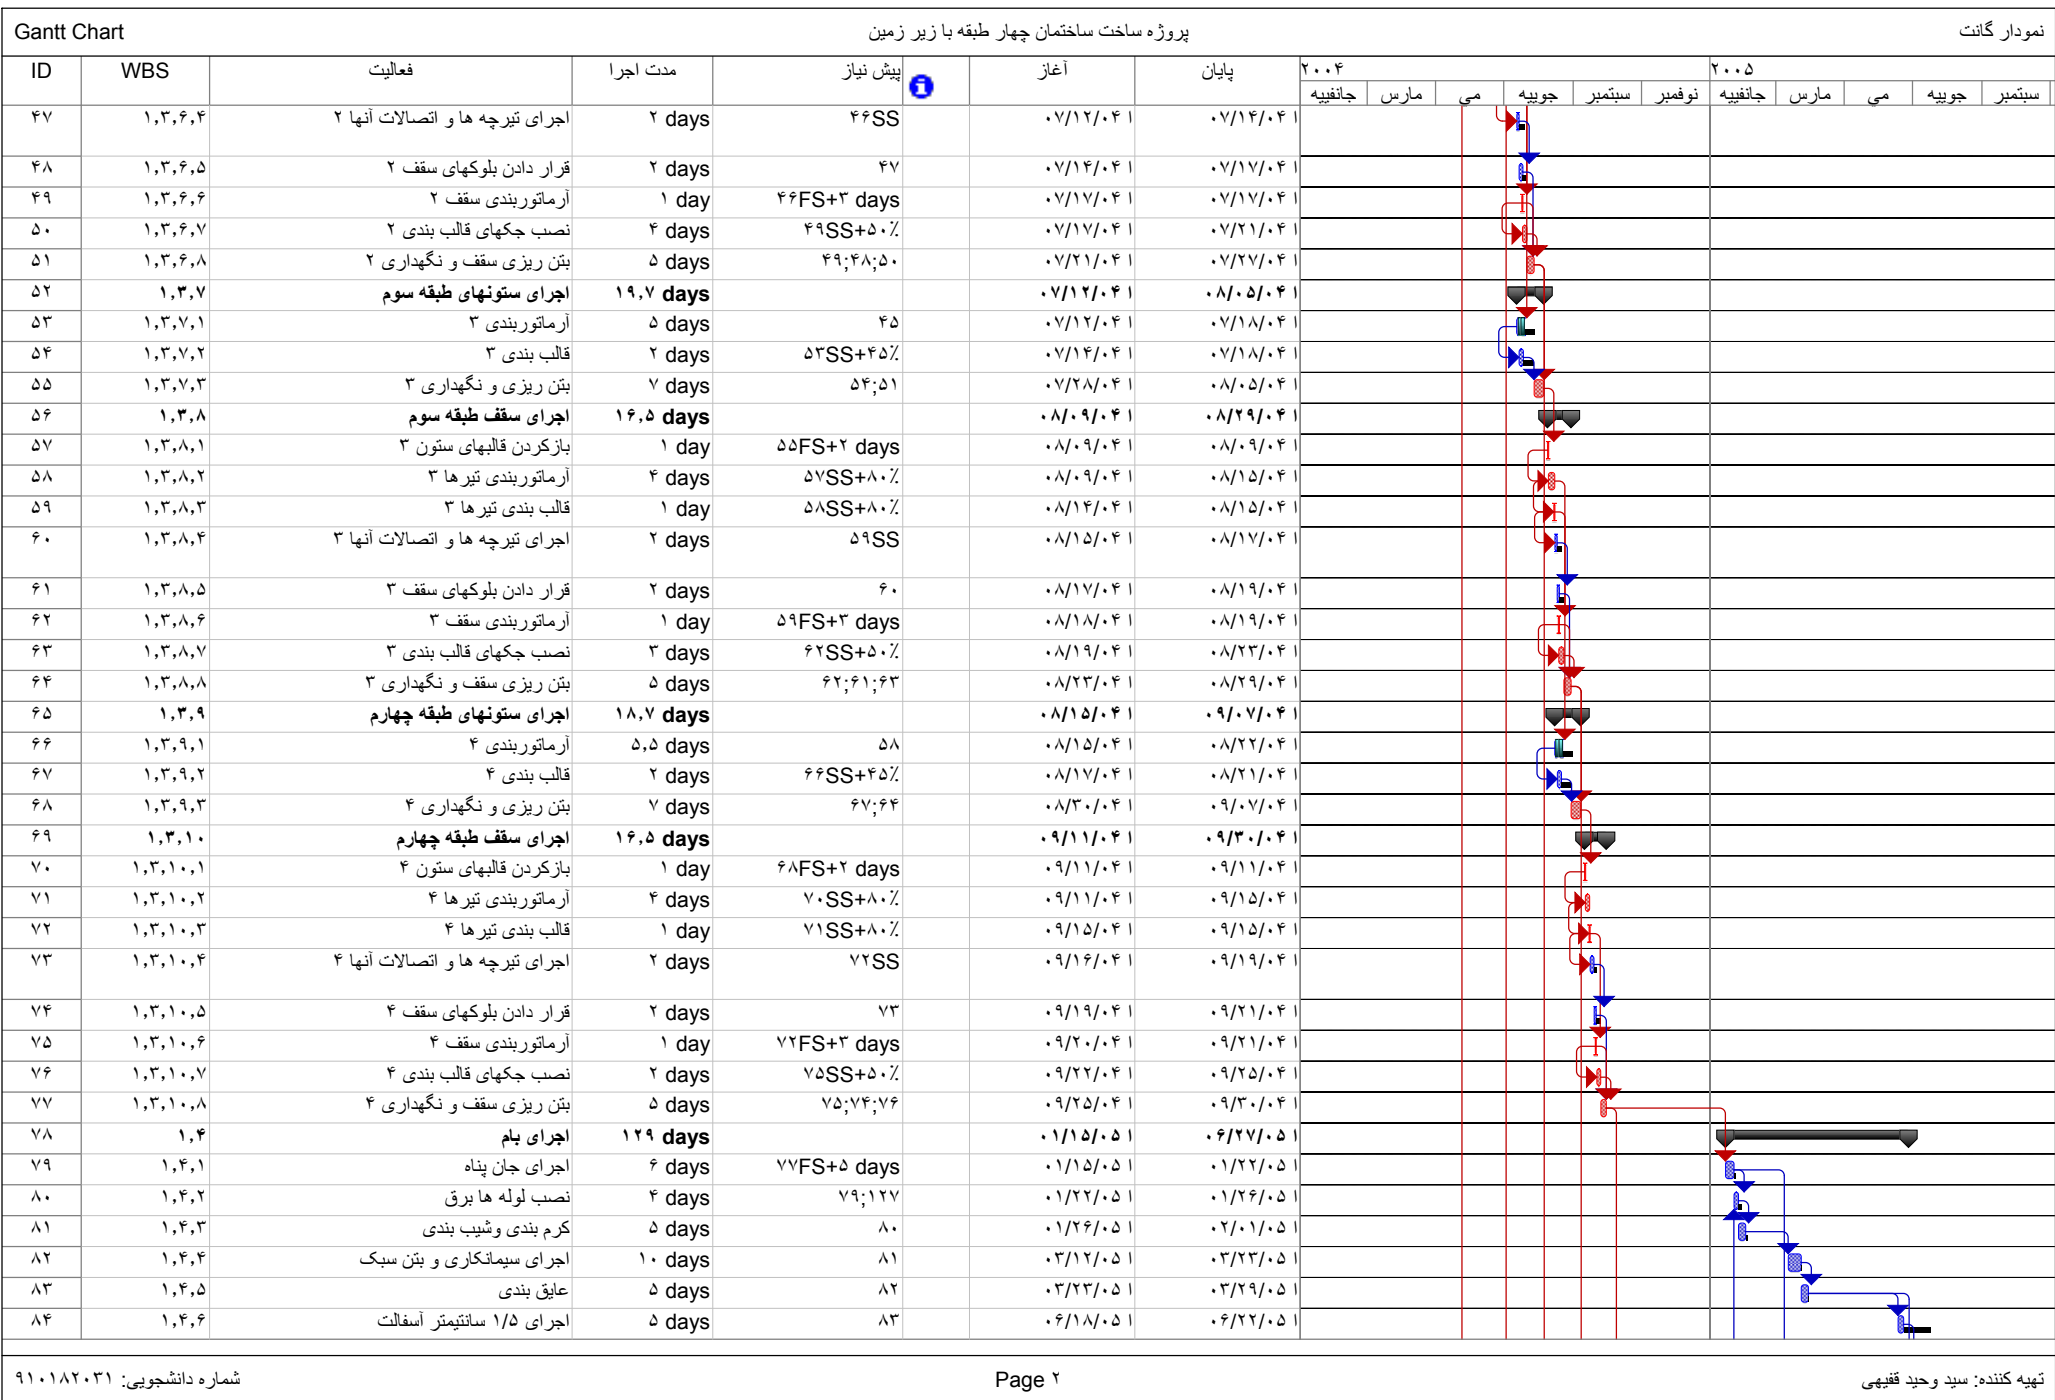

Gantt Chart

ID	WBS	فعالیت	مدت اجرا	پیش نیاز	آغاز	پایان	۲۰۰۴				۲۰۰۵				
							سپتامبر	اکتوبر	نوامبر	دسامبر	ژانویه	فوریه	مارس	آوریل	
۱۱۴	۱,۱۰,۲	لوله کشی فاضلاب طبقات	۲۱ days	۱۰۹SS	۰۷/۰۳/۰۴	۰۷/۲۸/۰۴									
۱۱۵	۱,۱۰,۳	لوله کشی آب سرد و گرم - سرمایشی و گرمایشی	۱۰۸ days		۱۰/۲۵/۰۴	۰۳/۱۲/۰۵									
۱۱۶	۱,۱۰,۳,۱	لوله کشی طبقات	۲۱ days	۱۱۴SS+۸۰٪;۹۵	۱۰/۲۵/۰۴	۱۱/۲۱/۰۴									
۱۱۷	۱,۱۰,۳,۲	لوله کشی شوافز	۲۵ days	۱۱۶	۱۱/۲۱/۰۴	۱۲/۲۲/۰۴									
۱۱۸	۱,۱۰,۳,۳	تست لوله کشی	۴ days	۱۱۷	۱۲/۲۲/۰۴	۱۲/۲۷/۰۴									
۱۱۹	۱,۱۰,۳,۴	ضد زنگ لوله ها	۴ days	۱۱۸	۱۲/۲۸/۰۴	۰۱/۰۲/۰۵									
۱۲۰	۱,۱۰,۳,۵	عایقکاری لوله ها	۶ days	۱۱۹	۰۲/۰۵/۰۵	۰۲/۱۲/۰۵									
۱۲۱	۱,۱۰,۳,۶	نصب پکیج	۵ days	۱۲۰	۰۳/۰۶/۰۵	۰۳/۱۲/۰۵									
۱۲۲	۱,۱۰,۳,۷	کانال کشی کولر طبقات	۳۰ days	۹۵	۱۰/۲۵/۰۴	۱۲/۰۱/۰۴									
۱۲۳	۱,۱۱	اجرای تاسیسات برقی - مرحله اول	۸۸ days		۰۷/۲۲/۰۴	۱۱/۱۰/۰۴									
۱۲۴	۱,۱۱,۱	ترسیم خط تراز	۳ days	۱۱۴SS+۷۵٪	۰۷/۲۲/۰۴	۰۷/۲۶/۰۴									
۱۲۵	۱,۱۱,۲	شیرارکشی دیوارها و طبقات	۱۶ days	۱۲۴	۰۷/۲۶/۰۴	۰۸/۱۵/۰۴									
۱۲۶	۱,۱۱,۳	نصب قوطی ها و جعبه های دسترسی طبقات	۱۷ days	۱۲۵	۰۸/۱۶/۰۴	۰۹/۰۶/۰۴									
۱۲۷	۱,۱۱,۴	لوله کشی برق طبقات	۱۸ days	۱۲۶SS+۲۰٪	۰۸/۱۹/۰۴	۰۹/۱۲/۰۴									
۱۲۸	۱,۱۱,۵	پوشاندن روی لوله ها	۴ days	۱۲۷	۱۰/۲۵/۰۴	۱۰/۳۰/۰۴									
۱۲۹	۱,۱۱,۶	نصب تابلوهای برق	۱۰ days	۱۲۸	۱۰/۳۰/۰۴	۱۱/۱۰/۰۴									
۱۳۰	۱,۱۱,۷	سیم کشی طبقات	۲۲ days	۱۲۷SS+۲۰٪	۰۸/۲۴/۰۴	۰۹/۲۱/۰۴									
۱۳۱	۱,۱۲	کف سازی طبقات	۱۹۱,۵ days		۱۰/۰۲/۰۴	۰۶/۰۱/۰۵									
۱۳۲	۱,۱۲,۱	پوکه ریزی	۱۸ days	۱۳۰	۱۰/۰۲/۰۴	۱۰/۲۴/۰۴									
۱۳۳	۱,۱۲,۲	اجرای سنگ موزاییک کف	۳۰ days	۱۳۲SS+۵۰٪	۱۰/۱۲/۰۴	۱۱/۲۰/۰۴									
۱۳۴	۱,۱۲,۳	اجرای سرویسها و آشپزخانه ها	۱۱۶,۵ days		۰۱/۰۴/۰۵	۰۶/۰۱/۰۵									
۱۳۵	۱,۱۲,۳,۱	کرم بندی	۴۸ days		۰۱/۰۴/۰۵	۰۳/۰۶/۰۵									
۱۳۶	۱,۱۲,۳,۱,۱	کرم بندی زیر زمین	۵ days	۱۳۲SS+۲۵٪	۰۱/۰۴/۰۵	۰۱/۱۰/۰۵									
۱۳۷	۱,۱۲,۳,۱,۲	کرم بندی طبقه اول	۵ days	۱۳۶	۰۲/۰۷/۰۵	۰۲/۰۸/۰۵									
۱۳۸	۱,۱۲,۳,۱,۳	کرم بندی طبقه دوم	۵ days	۱۳۷	۰۲/۱۵/۰۵	۰۲/۲۱/۰۵									
۱۳۹	۱,۱۲,۳,۱,۴	کرم بندی طبقه سوم	۵ days	۱۳۸	۰۲/۲۲/۰۵	۰۲/۲۸/۰۵									
۱۴۰	۱,۱۲,۳,۱,۵	کرم بندی طبقه چهارم	۵ days	۱۳۹	۰۲/۲۸/۰۵	۰۳/۰۶/۰۵									
۱۴۱	۱,۱۲,۳,۲	عایقکاری	۶۹,۵ days		۰۱/۱۱/۰۵	۰۴/۰۹/۰۵									
۱۴۲	۱,۱۲,۳,۲,۱	عایقکاری زیر زمین	۸ days	۱۳۶	۰۱/۱۱/۰۵	۰۱/۲۰/۰۵									
۱۴۳	۱,۱۲,۳,۲,۲	عایقکاری طبقه اول	۸ days	۱۳۷	۰۲/۱۳/۰۵	۰۲/۲۲/۰۵									
۱۴۴	۱,۱۲,۳,۲,۳	عایقکاری طبقه دوم	۱۶ days	۱۳۸	۰۳/۰۲/۰۵	۰۳/۲۲/۰۵									
۱۴۵	۱,۱۲,۳,۲,۴	عایقکاری طبقه سوم	۸ days	۱۳۹	۰۳/۳۰/۰۵	۰۴/۰۹/۰۵									
۱۴۶	۱,۱۲,۳,۲,۵	عایقکاری طبقه چهارم	۸ days	۱۴۰	۰۳/۰۷/۰۵	۰۳/۱۶/۰۵									
۱۴۷	۱,۱۲,۳,۳	نصب سنگ توالت ها و کفشوهای طبقات	۹ days	۱۴۶SS+۵۰٪	۰۳/۱۲/۰۵	۰۳/۲۲/۰۵									
۱۴۸	۱,۱۲,۳,۴	اجرای کاشی و سرامیک	۶۰ days		۰۳/۱۷/۰۵	۰۶/۰۱/۰۵									
۱۴۹	۱,۱۲,۳,۴,۱	اجرای کاشی و سرامیک زیر زمین	۱۲ days	۱۴۷SS+۵۰٪;۱۴۲	۰۳/۱۷/۰۵	۰۴/۰۲/۰۵									
۱۵۰	۱,۱۲,۳,۴,۲	اجرای کاشی و سرامیک طبقه اول	۱۲ days	۱۴۹;۱۴۳	۰۴/۰۲/۰۵	۰۴/۱۷/۰۵									

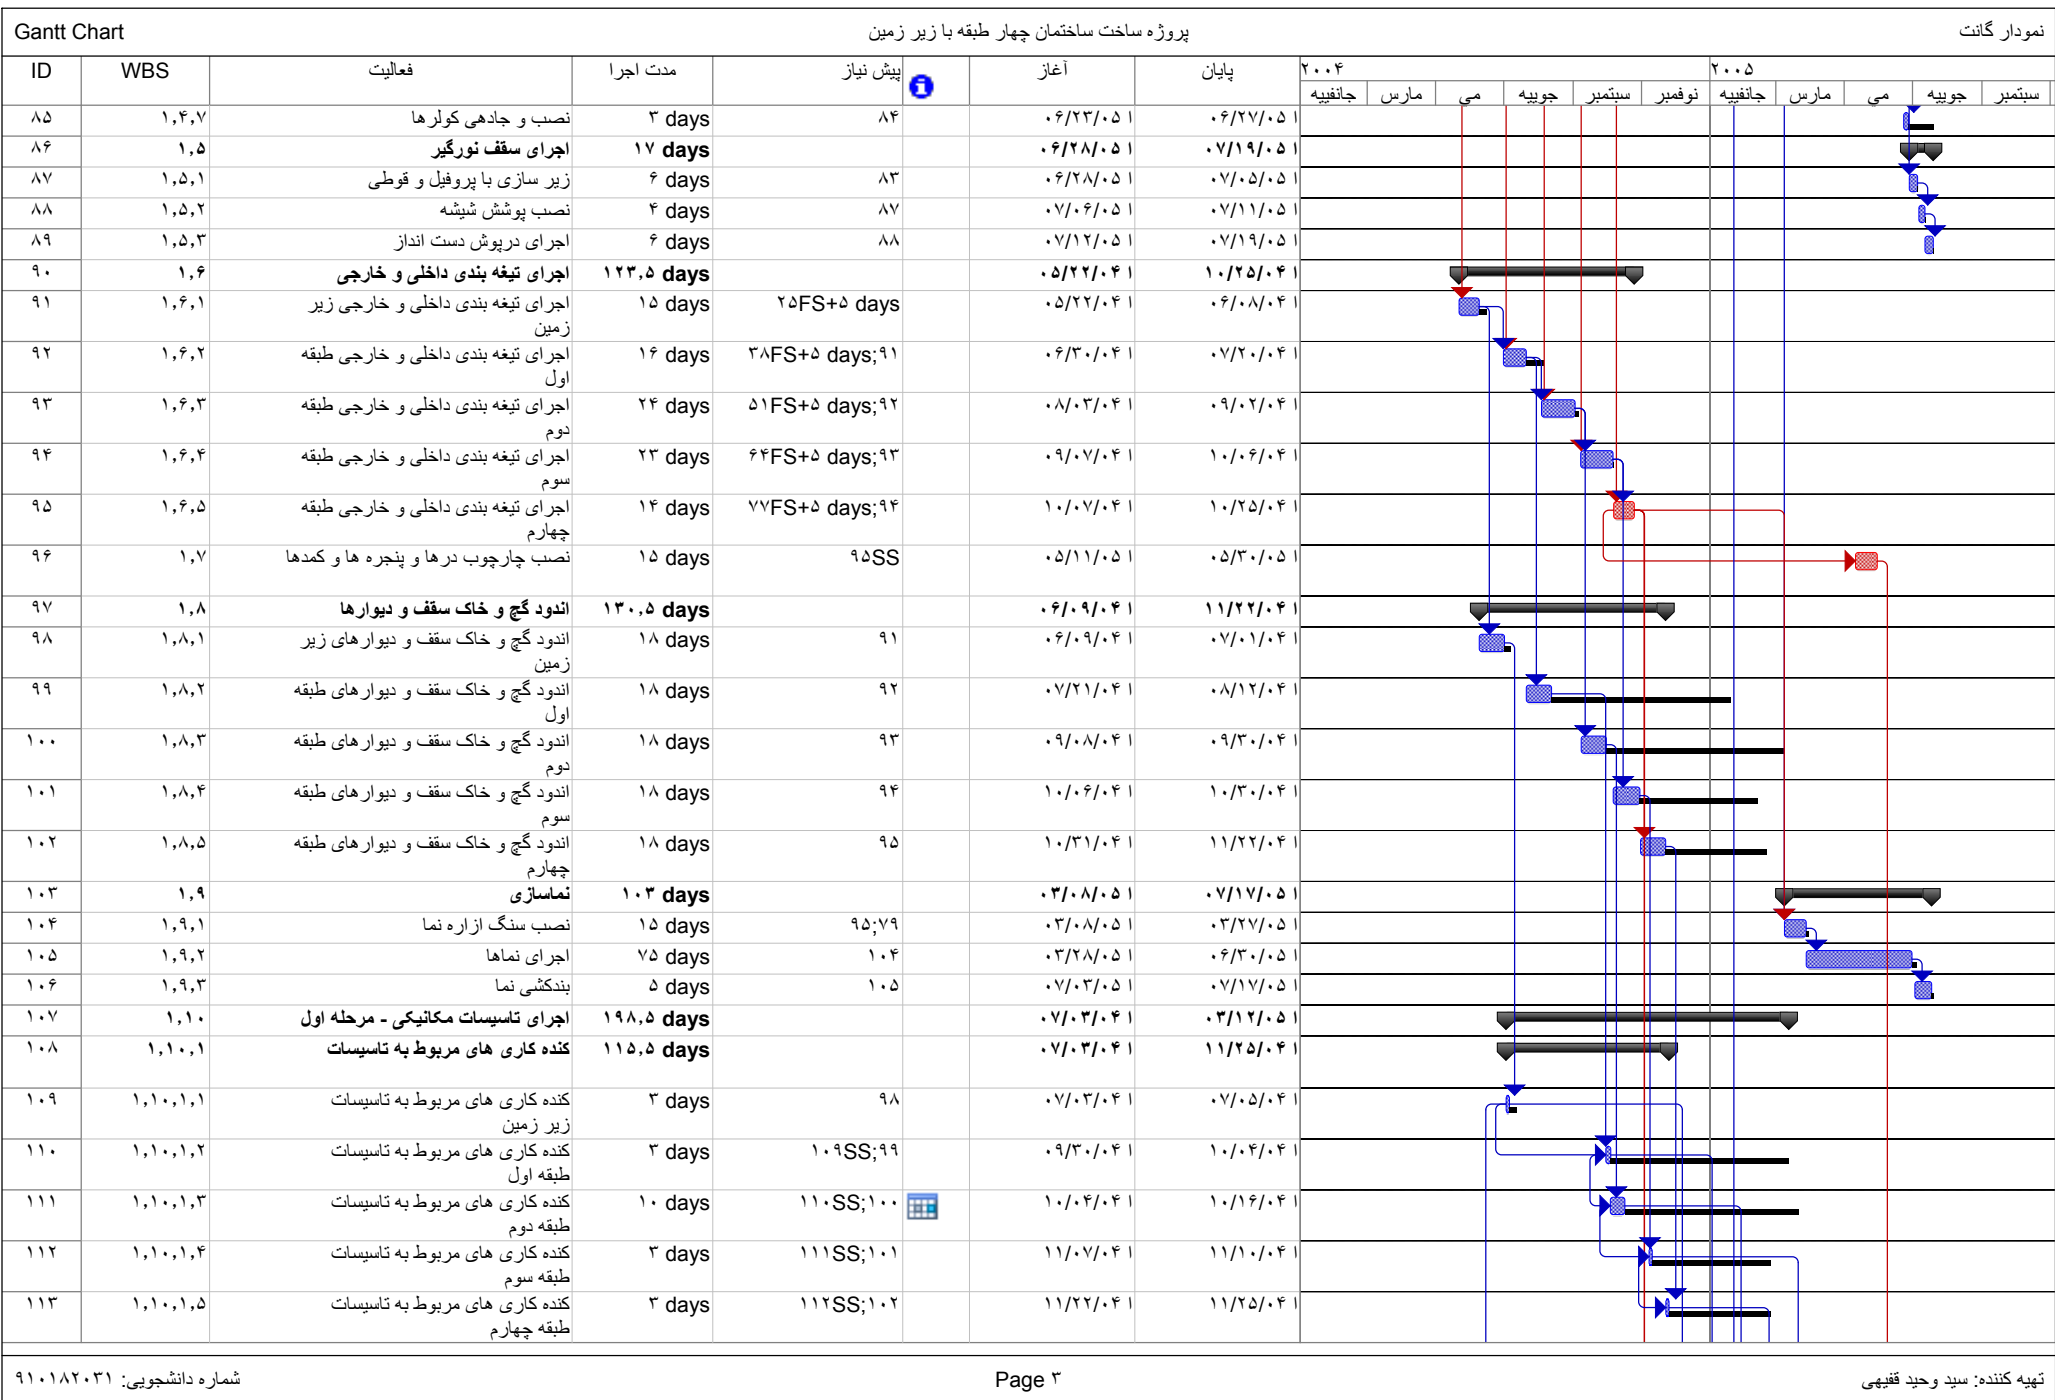
